IMPRESA CORDMAND S.r.l.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Provincia di Forlì-Cesena

ROTATORIA PANIGHINA

DESCRIZIONE LAVORI	GG.
FASE 1 - INTERVENTO FRONTE BABBI (DAL 22/01 AL 15/03)	
ACCANTIERAMENTO AREA, SONDAGGI, SMONTAGGIO BARRIERE STRADALI	
DEMOLIZIONE PORZIONE PISTA CICLABILE INTERFERENTE	
REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE	
FOGNATURA BIANCA	
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
METANODOTTO 2I RETE GAS	
TELEGUIDATA IRIDEOS - SEMAFORICA	
TELEGUIDATA IRIDEOS - 9 TUBI	
PREDISPOSIZIONE NUOVO Q.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
POLIFERE E POZZETTI TELEFONIA	
MISTO CEMENTATO	
CORDOLI STRADALI	
BASE+BINDER	
FASE 2 - INTERVENTO FRONTE ROMAGNA SCALE (DAL 18/03 AL 19/04)	
ACCANTIERAMENTO AREA, DEMOLIZIONE CORDOLO E RECINZIONE, ABBATTIMENTO ALBERO	
FOGNATURA BIANCA	
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
POLIFERE E POZZETTI TELEFONIA	
ACQUEDOTTO HERA	
RIPRISTINO RECINZIONE E MURETTO	
CORDOLI STRADALI	
RIPRISTINI ASFALTO	
FASE 3 - INTERVENTO FRONTE MARECO (DAL 22/04 AL 07/06)	
ACCANTIERAMENTO AREA, SMONTAGGIO BARRIERE STRADALI, ABBATTIMENTO N° 3 ALBERI	
DEMOLIZIONE PORZIONE PISTA CICLABILE INTERFERENTE, SMONTAGGIO PASSERELLA	
POSA SCATOLARE	
ACQUEDOTTO HERA	
FOGNATURA NERA HERA	
RINTERRI	
FOGNATURA BIANCA	
REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE	
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
POLIFERE E POZZETTI TELEFONIA	
MISTO CEMENTATO	
CORDOLI STRADALI	
BASE+BINDER	
FASE 4 - INTERVENTO INTERNO ROTATORIA (DAL 06/06 AL 21/06)	
BONIFICA AREE VERDI ESISTENTI	
REALIZZAZIONE ROTATORIA PROVVISORIA	
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE	
POSA SCATOLARE	
ACQUEDOTTO HERA	
FOGNATURA NERA HERA	
FASE 5 - INTERVENTO FRONTE VIOCAR (DAL 24/06 AL 09/08)	
ACCANTIERAMENTO AREA E DEMOLIZIONE CORDOLO E RECINZIONE	
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE	
POSA SCATOLARE	
FOGNATURA BIANCA	
ACQUEDOTTO HERA	
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
POLIFERE E POZZETTI TELEFONIA	
FONDAZIONE STRADALE	
CORDOLI STRADALI	
RIPRISTINI ASFALTO	
FASE 6 - INTERVENTO ROTATORIA FINALE (DAL 19/08 AL 13/09)	
SEGNALETICA VERTICALE, BARRIERE	
FRESATURE	
TAPPETO DI USURA	
SEGNALETICA ORIZZONTALE	
VERDE E IRRIGAZIONE	

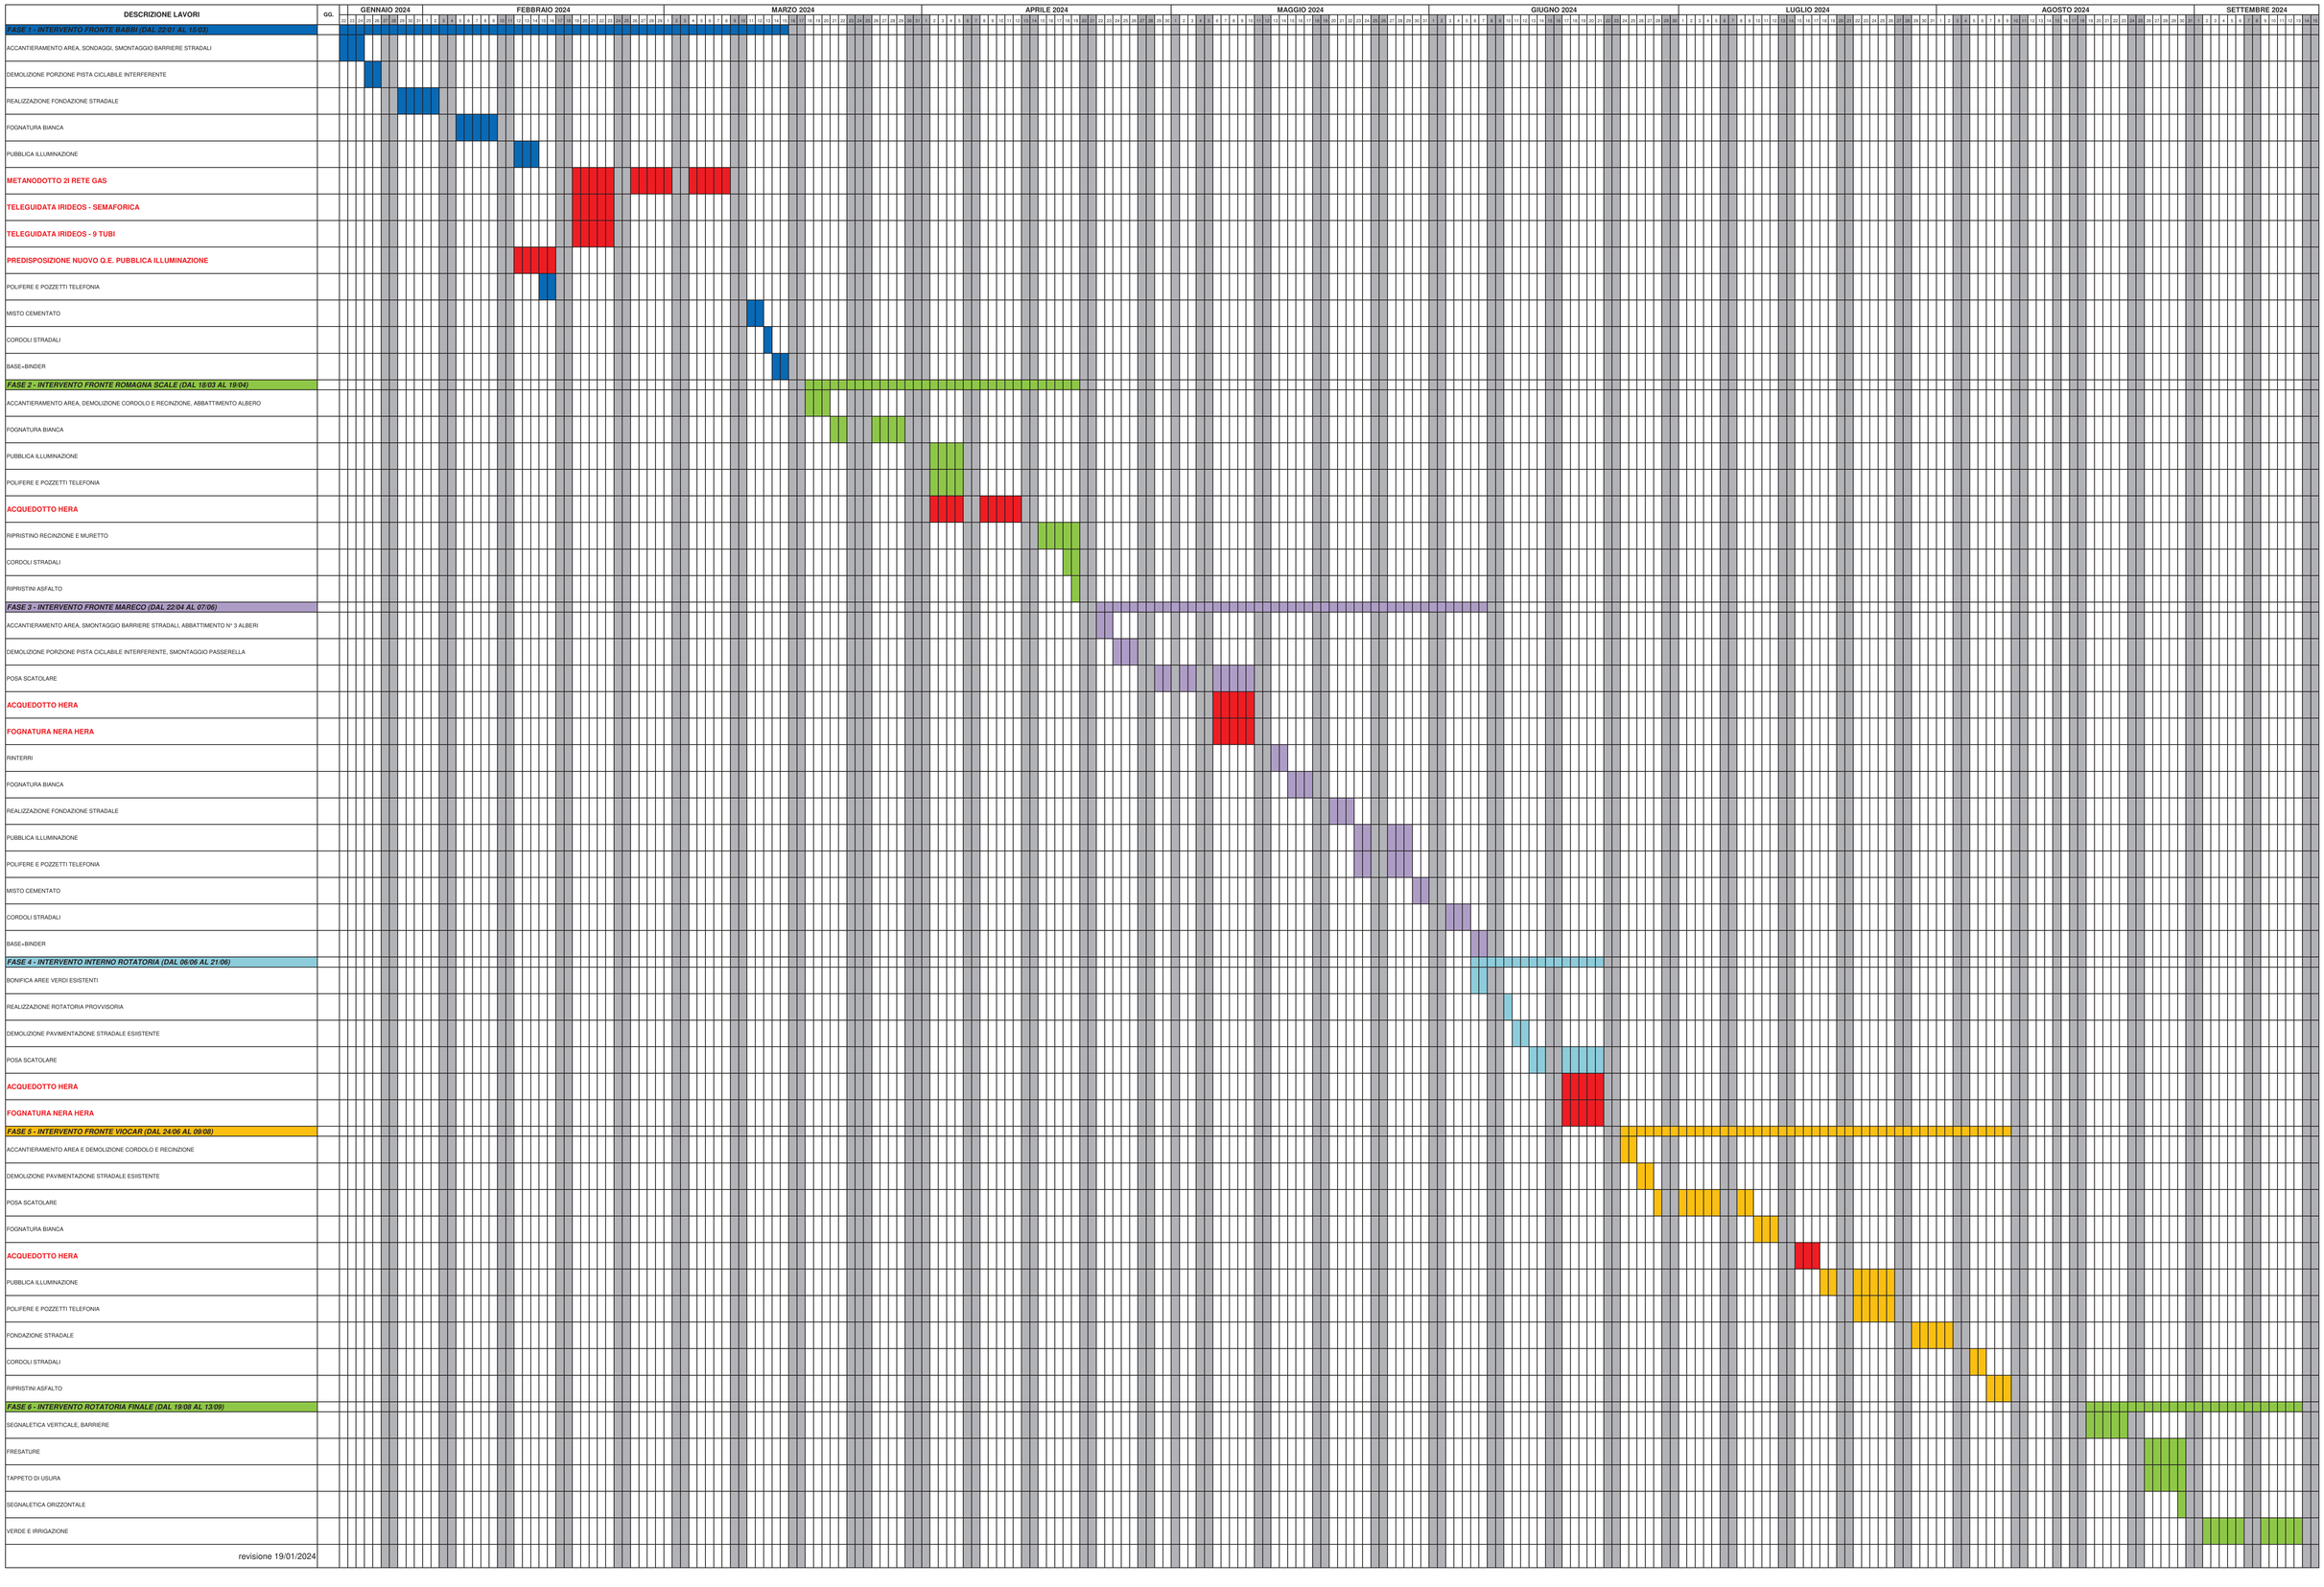

revisione 19/01/2024
